

屯田兵屋改修復元事業 概要

- ◎工事名 屯田兵屋復元工事  
 ◎工期 平成19年8月22日 から 平成19年11月29日 まで  
 ◎契約金額 6,100,500 円



◎工事経過	現地調査【土台、軸組現況及び再使用等の検討】	8月27日
	現地調査【建具関係現況及び再使用検討】	8月28日
	現地調査【外壁下見板現状確認及び再使用検討】	8月29日
	写真撮影	9月1日
	解体開始【内部解体、内部写真】	9月3日
	現地解体終了・周囲樹木整理（伐採）	9月6日
	基礎遣り方開始	9月7日
	再使用材の整理、軸組加工修復	9月10日
	基礎土工（根堀）	9月11日
	基礎砂利、型枠、配筋工事	9月12日
	コンクリート打設	9月13日
	土台取付	9月19日
	建て方開始	9月20日
	屋根工事開始	9月22日
	内部造作開始	9月25日
	屋根板金工事	10月4日
	外壁下見板張り	10月5日
	煙出し取付	10月11日
	建具工事開始	10月24日
	火災報知設備	10月26日
工事完成	10月30日	

◎復元工事の内容	
・ 外壁下見板	正面及び道路側妻面は、既設材を再使用
・ 土台	新材を使用
・ 屋根垂木	断面を拡大し、新材を使用
・ 内部建具	既存使用
・ 外部建具	新設
・ 建物周囲	既存樹木伐採
・ 柱・梁等	原則再使用に努めた

# 改修前

# 改修後

全景

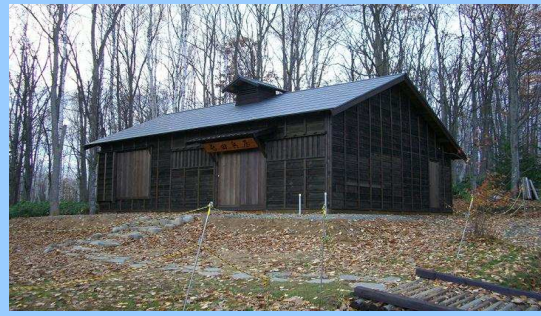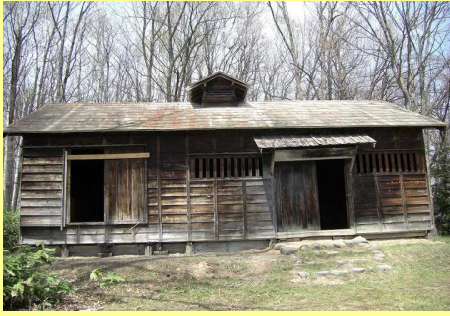

部屋1



居間



部屋2



天井





# 改修後の屯田兵屋

